

## Projektbeskrivelse

### Forlægning af del-strækning af Nors Å.

#### Revideret efter partshøring


Hjørring og Frederikshavn kommuner ønsker at flytte en del strækning af Nors Å tilbage, hvor det tidligere forløb.

Nors Å blev reguleret i 1972, hvor åen blev gravet bredere, dybere og rettet ud på del strækninger.

Den del strækning som kommunerne ønsker at lægge tilbage i det oprindelige leje, har vist sig vanskeligt at vedligeholde da der er blødbund. Derfor skyder bunden op, hvilket bevirker at vandet står for højt.

Der er tidligere forsøgt at styre vandløbet ved at sætte faskiner langs med siderne. Dette har ikke virket.

På nedenstående kort ses den strækning der flyttes tilbage til det oprindelige løb.

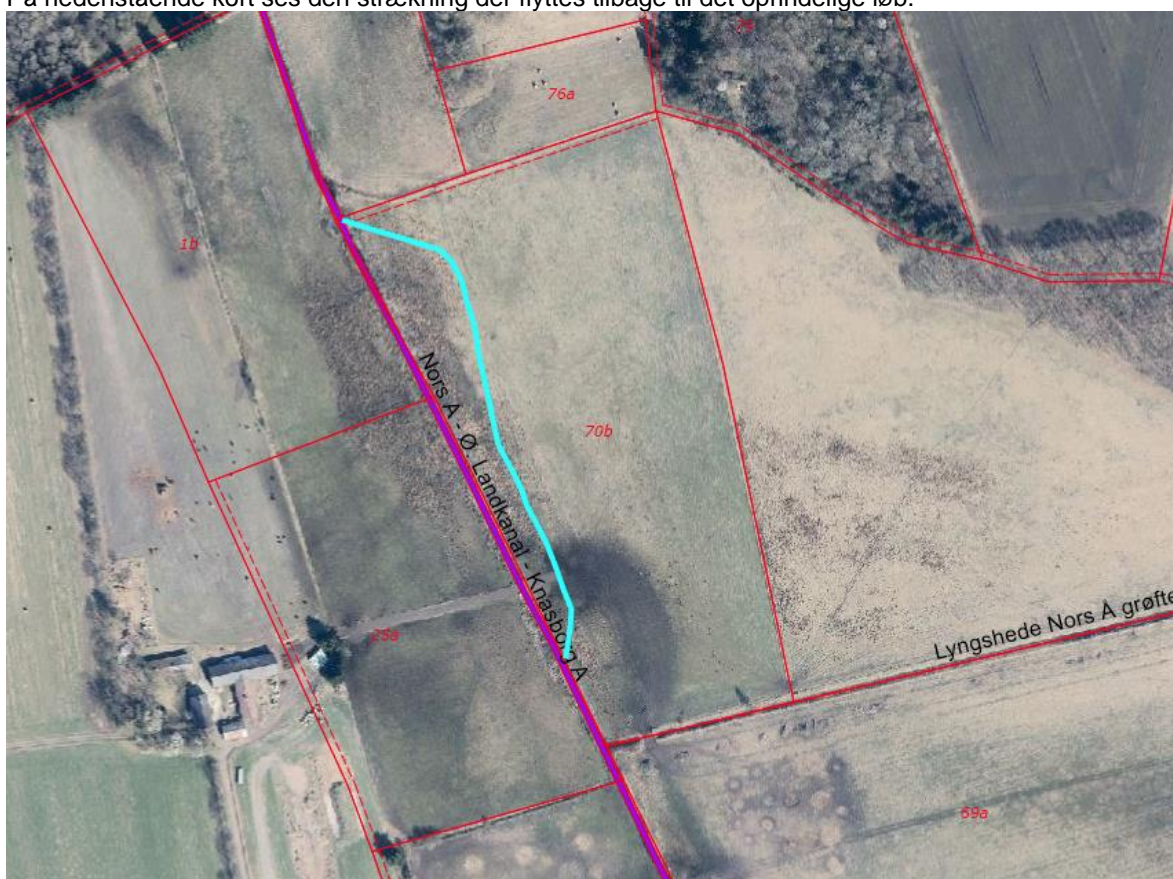


Lyseblå streg, nyt forløb efter flytning.

Det nye vandløb anlægges med bundkote jf. regulativet. Bund bredden bliver på 2 meter, og brinkanlægget bliver 1:1,5-2.

Ejer af arealet ønsker at det nuværende forløb efterlades åbent, af hensyn til dræn til åen. Det er aftalt at denne strækning efterfølgende får status af privat vandløb.

Side2/2

Der er fra kommunernes side et ønske om at der anlægges et sandfang i forbindelse med projektet.

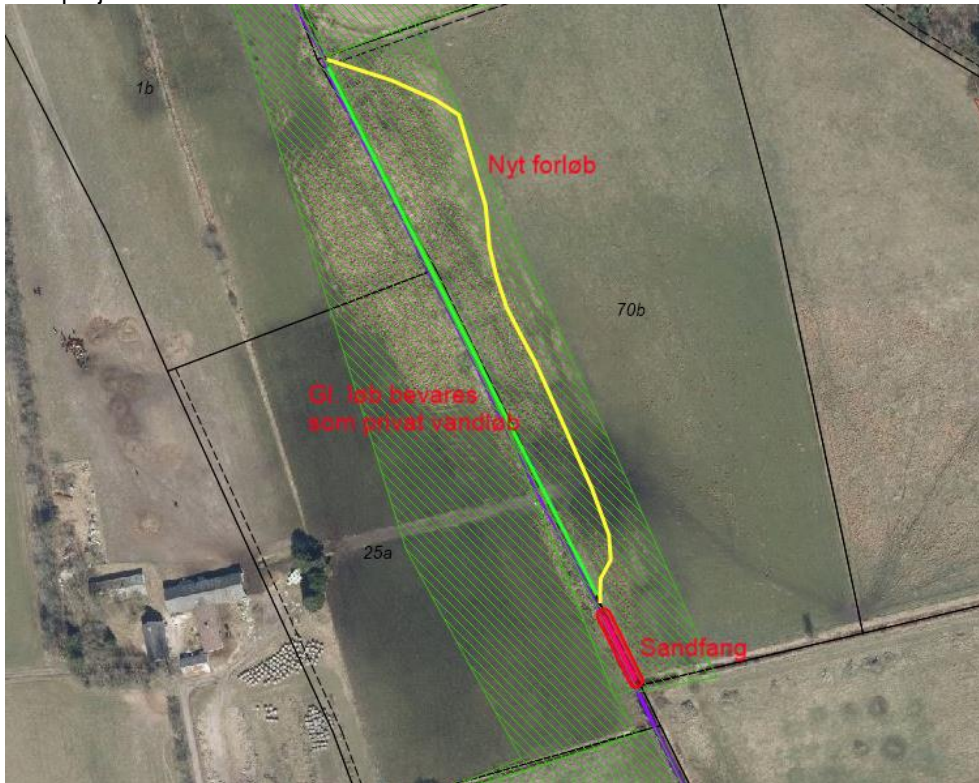

Projekt med ændringer efter høring.

Overskud af jord samt oprenset materiale fra sandfanget udjævnes på arealer der ikke er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Projektet forventes gennemført i august-september måned 2026.
